



ほ場整備工事だより

令和8年7月吉日【第23号】
笠木地区工事安全・連絡協議会



笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。
工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

工事概要

『工事名』 笠木地区 区画整理第4次・第6次工事
 『工事場所』 新潟市西区 笠木 地内
 『工事期間』 令和7年3月27日～令和8年7月31日 (第4次工事)
 令和8年3月26日～令和9年1月29日 (第6次工事)
 『作業時間』 午前8:00～午後5:00 (日曜日は休工)
 『工事の問合せ先』

＜発注者＞

新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課

TEL 0256-72-0967


＜工事受注者＞

株式会社 吉田建設

TEL 025-201-6003

第4次工事 現場代理人 矢部 るり子
 特例監理技術者 本間 裕
 第6次工事 現場代理人 山屋 敬
 監理技術者 佐藤 史也

工事施工箇所位置図

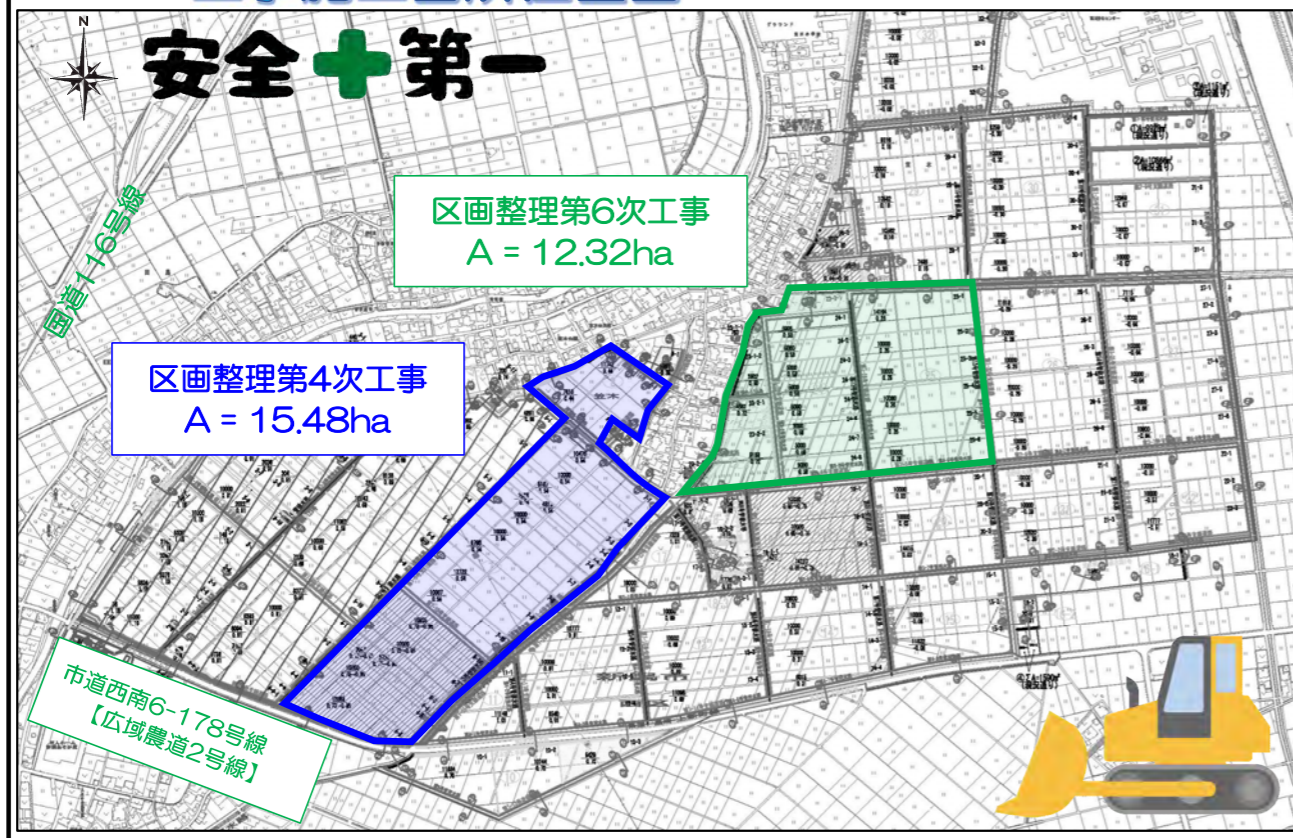

第4次工事 月間工程表【7月】

月間安全目標	1. 第三者災害の防止														1. 熱中症の対策徹底														1. 重機災害の防止														1. 交通事故の防止														玉掛ワイヤー 点検色	赤色
	6月														7月																																											
月日・曜日	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	元請・協力会社													
工種	[Blank grid for monthly schedule]																																										元請・協力会社															
書写作成	[Blank grid]																																										(株) 吉田建設															
主要工事の工程	[Blank grid]																																										確認する資格 〔免 許〕 〔技能講習〕 〔特別教育〕															
使用機械・設備等	[Blank grid]																																										4月30日現在 無 災 害 3,200 日 労 働 延 時 間 計 画 99.1 % 進 捗 率 実 施 98.9 %															
行事予定	[Blank grid]																																										[Blank grid]															

第6次工事 月間工程表【7,8月】

月間安全目標	1. 交通災害の防止														1. クレーン災害の防止														1. 重機災害の防止														1. 公衆災害の防止														1. 重機災害の防止														1. クレーン災害の防止														玉掛ワイヤー 点検色	赤色
	7月														8月																																																																							
月日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	元請・協力会社																							
工種	[Blank grid]																																										元請・協力会社																																											
準備工	[Blank grid]																																										御吉田建設																																											
整地工	[Blank grid]																																										御五十嵐重機建設																																											
用水路工 (管水路)	[Blank grid]																																										木暮建設																																											
排水路工 (管水路)	[Blank grid]																																										木暮建設																																											
排水路工 (雨水路)	[Blank grid]																																										御吉田建設、御富山建設、御本多建設																																											
排水路工 (雨水路構造部)	[Blank grid]																																										御吉田建設、御富山建設、御本多建設																																											
道路工	[Blank grid]																																										御五十嵐重機建設																																											
旧構撤去工	[Blank grid]																																										御吉田建設																																											
仮設工	[Blank grid]																																										御吉田建設																																											
交通誘導員	[Blank grid]																																										[Blank grid]																																											
行事予定	[Blank grid]																																										6月26日現在 無 災 害 63 日 労 働 延 時 間 計 画 20.1 % 進 捗 率 実 施 25.1 %																																											

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています

株式会社 吉田建設

第4次工事現場ホームページ
スマホ・ケータイカメラで
読み取り!!!

区画整理第4次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

令和7年4月より工事を開始した第4次工事ですが、令和8年7月をもちまして工事完了となります。16か月の間、ご不便をおかけしましたが皆さまのご協力のおかげで無事完成を迎えることができます。長きにわたり、ご理解ご協力いただきありがとうございました。

R8.6月末撮影



区画整理第6次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

6月は主に旧建造物の撤去・搬出、仮設ヤードの造成、塩ビ管・コンクリート二次製品・砂等の資材搬入、排水フリーユーム、排水構造物の施工を行いました。

7月の作業としては、引き続き塩ビ管・コンクリート二次製品・砂等の資材搬入・現場内運搬、排水フリーユーム、排水構造物の施工を行い中旬頃から管用排水路の施工を予定しております。

施工及び資機材の搬入に伴い、市道新田大友線を工事用車両が頻繁に走行させていただきます。

資機材の現場搬入は9時から16時の間に行い、耕作者の方々、一般車両の妨げにならないよう安全運転で実施いたします。

皆様にはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

基礎コンクリート打設完了



ボックスカルバート設置状況



コンクリート二次製品荷卸し状況



排水フリーユーム布設状況

