

# ほ場整備工事だより











笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し 上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。

工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

#### 工事概要

『工事名』 笠木地区 区画整理第4次工事

『工 事 場 所』 新潟市西区 笠木 地内

令和7年3月27日~令和8年1月30日(第4次工事) 『工事期間』

『作業時間』 午前8:00~午後5:00(整地作業時は午前6:30~午後6:30)

(天候次第では日曜日も作業を行います。)

『工事の問合せ先』

≪発注者≫

新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課

TEL 0256-72-0967


≪工事受注者≫

株式会社 吉田建設

現場代理人 矢部 るり子

TEL 025-201-6003

特例監理技術者 本間 裕

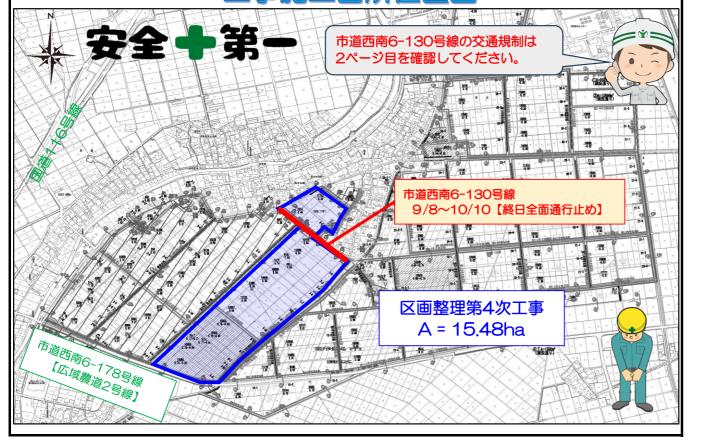

### 月間工程表【9月】

	月間安全目標	1.重機災害の防止	1.熱中症の予防	1公共物破损防止	1.第三者災害の防止	玉掛ワイヤー 赤 色								
	月日・曜日	8 月	'	9 月										
		19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	元請・協力会社								
I	種	火水木金土日月火水木金土日	月火水木金土日月火水	木 金 土 日 月 火 水 木 金 土	日月火水木金土日月火									
	用水路工·排水路工 (管水路)	中区排水、給水栓、空気井、仕切井設置				(株) 木雙建設								
主要工事の工程	排水路工(開水路)	海畔 法面整形	第21種排	K樹新工(水海普切回(弗了後)										
	旧道路撤去工 旧水路埋立工	秀士殿出		第21種排水描断工【施工時】 養日全面獲行止め 9/8~10/10迄		(株) 吉田建設 (有) 五十巣重機建設								
	道路工	盛士、法面整形 <u>\$8</u> 00利		9/8~10/10/2		(有)富山建業								
	整地工		基盤切盛) 、畦畔壮上げ		均平整地 田面維物原去									
	仮設工		敷鉄板撤去 軽量輝矢板	打選 使曲取付	軽量網 朱板引抜	(株) 吉田建設 (株) E-システム								
	附帯工		<b>衛灯移設</b>	ガードレール設置		(有) 高静電機 近藤興助工業 (株)								
	国交省砂質土受入		日/300~400m3 (巻編稿ストック	P-F1										
				天候次第では、土・日曜日、祝日は作業を行います。										
	新潟市発注 水道管切回 (支障物)	8月末完了予定												
	交通誘導員配置		1人 1人 1人 1人 1人 3人 3人 3人	3人 3人 3人 3人 3人	<u> </u>	(株) トップロード								
	バックホウ 0.25~0.5m3級					確認する資格								
使用	ダンブトラック 2t~4t					【 免 許 】 ・自動車免許(番通・中型・大型)								
機	不整地運搬車 4t~7t					(技能講習)								
械	発電機 20~37KVA					・車両系建設機械(整地・規制・構込) ・車両系建設機械(解体)								
80	ブルドーザ St級・1Gt級					・小型移動式クレーン・不整地運搬車								
備等						・ 不整地連新単 ・ 地山の掘削 ・ 主掛け								
4						・玉掛け 【特別教育】								
						・ローラー運転 ・刈払機								
		災害防災害防	₽		店往 災害 _	* 对瓜슨 8月31日 現在								
	行事予定	安全バトロ安全教育	安全教長	月 安全	全防育	無 災 害 1.264 Hr								
		T   電	議 会 育	展 育		計画 83.6 % 運動率								
		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			l,	実施 78.3 %								

#### 月間工程表【10月】

J	月間安全目標	1.		1.重機災害の防止							1公衆災害の防止						1 交通災害の防止							玉掛ワイヤー 点接色	黄色			
85.7		9 月				$\neg$					10 月						_											
_ I		19 20 21 22 金 土 日 月					1 2 水 木	3 4 ≆ ±	5 6 日 月						4 15			19 20							29 30		元請・	協力会社
_	用水路工・排水路工 (管水路)	田区能水。約	2000	1000																			········ 用	水管道	路描断	i	(株) 吉田 (株) 木菱	##9 ##9
	排水路工(開水路)	第21種排水関新工 [ポッ		クスカルバート据り	图列					舗装仮復日		黄田	全面著	・機断工(施工時) た止め		Ì				(市)	運新日	大友線						
	道路工	法面整形 象型利								9/8~10/10/5													···· (株)吉田建設 (有)五十嵐重機建態					
	整地工		<b>明</b> 学生上	は、均平			田南維物	撒技																			(有) 富山i (株) E-シ	建業
	仮設工		- 片敷鉄板	、砂噴土	撤去	軽	網矢板5	亅抜							饭	激去												
	时帯工 天候次第				では、±	超日 -	配 - 祝日は作業を行います。						道路開新管衛		猫去	法 (機場)										(株) 吉田建設		
	国交省砂質土受入																											
	交通誘導員配置	1人 1人	1.4 1.7	V 1V	1/	人 1人	1人 1人	1人	1/	1人	1人 1人	1人		-	人 2人	2人 2人		2人	2人	2人 2	2人		2)	2人	2人 2)	시 2시	(株) トッ:	
	バックホウ 0.25~0.5m3級 ダンブトラック 2t~4t																						<b></b>			-	(免	する資格 許 】
	不整地運搬車 4t~7t										_	_		-		_		<b>—</b>	-	-	-		<b>-</b>				・自動車免許(a 【技能講習	7
	発電機 20~37KVA																										<ul><li>事庫系置機構</li><li>・車両系建設</li><li>・小型移動式</li></ul>	慢核 (解)
	ブルドーザ 8t級・10t級																									-	<ul><li>・不整地運搬</li><li>・地山の掘削</li><li>・玉掛け</li></ul>	
																											- 五暦// 【特別教育 ・ローラー選 ・刈払機	)
		_		店 社安	y.					雯		1											2 11 15		93 38		8月31	日現在
	行事 予定	安 全 數		全 パ ト	生 止 日	一斉清掃				全協議		安全教						月例点			安全數		£ // 1	1	害防止機器	一斉清掃	無 災 害 労働延時間	1.26
		F		- - -		掃				â		育				ĺ		検			育		Ė	1	議会	掃	進歩率	83.6







### 区画整理第4次工事

#### // 進捗状況および連絡事項 //

現在は旧道水路撤去・埋立、道路盛土・法面整形、荒整地(基盤切盛)作業を行っております。 9月も引き続きブルドーザ整地、バックホウで畦畔の仕上げ作業を行っていきます。

また、市道西南6-130号線(笠木保育園前)を終日全面通行止めで道路横断排水路(ボックスカルバート据付)の施工を行います。通行止め期間は9月8日(月)~

10月10日(金)までを予定しており、道路の通行が出来なくなるのでご了承願います。

大変ご迷惑・ご不便をお掛けいたしますがご協力をお願いいたします。

#### R7.8月末撮影















## 交通規制•迂回路

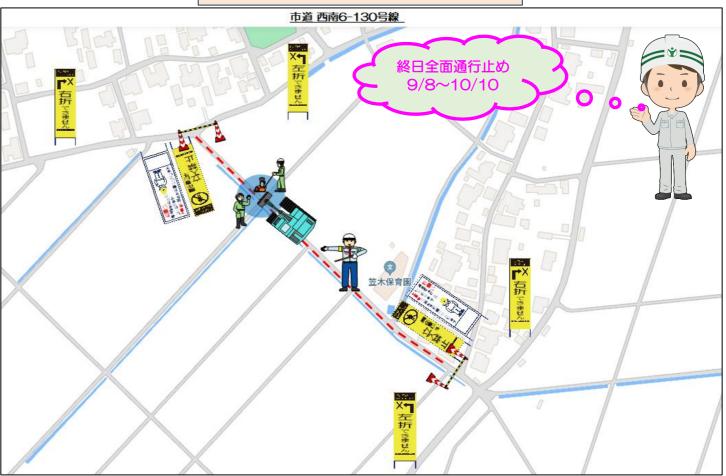

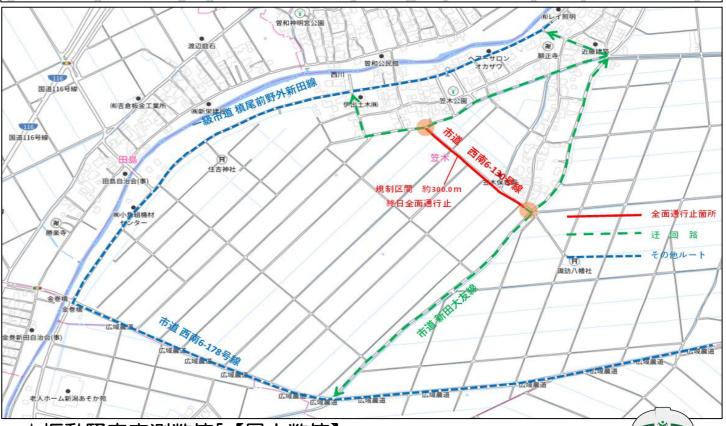

- ★振動騒音実測数値[【最大数値】
- ●道路工 盛土・法面整形作業 振動 43db・騒音 62db

★作業中止基準 振動70db・騒音80db★
